Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Вольский технологический колледж»

Специальность 09.02.07
«Информационные системы и программирование»

МДК 02.02 «Управление проектами»

КОМПЛЕКТ ОТЧЁТОВ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ № 1–13

по проекту программного средства
«Автоматизированная система проведения игры „Мафия“»
Пояснительная записка

с опорой на стандарты ЕСПД (ГОСТ 19)

Выполнил:	Коновалов Игорь Денисович
Группа:	ИТС-31
Проверил:	Мифтахов Н.И.
Дата:	15 октября 2026 г.

Вольск — 2026

Сведения о документе

Аннотация

Комплект содержит отчёты по практическим работам № 1–13 дисциплины МДК 02.02 «Управление проектами». Работы № 1–8 и № 10–13 подготовлены на материале проекта «Мафия», работа № 9 представляет теоретическую подготовку. Стиль основан на предоставленном отчёте по ЛР1–ЛР9: академический титульный лист, нумерованные разделы, цели, таблицы, чек-листы и выводы.

Границы достоверности

Дата анализа — 19.10.2026; исходная ревизия 293145e от 16.10.2026. Репозиторий не изменялся. Подтверждённые сведения основаны на исходниках и локальных проверках. Распределение ролей, бэклог, календарь, бюджет и сценарный мониторинг являются учебными проектными предложениями. Трекер, журналы времени, отзывы, репетиции и результаты 10 партий не предоставлены.

Комплект использует положения ЕСПД по составу и содержанию программных документов, но не выдаётся за полный утверждённый комплект ЕСПД: отсутствуют согласованные обозначения, подписи утверждения и формальные акты. Учебные таблицы и доклады не объявляются документами, обязательными по ГОСТ 19.

Содержание

Сведения о документе – стр. 2
Нормативные ссылки и источники – стр. 3
1. Создание проекта — стр. 4–5
2. Управление задачами проекта — стр. 6–10
3. Планирование проекта — стр. 11–12
4. Мониторинг и контроль — стр. 13–15
5. Управление документацией — стр. 16–17
6. Интеграция инструментов — стр. 18–19
7. Презентация результатов — стр. 20–21
8. Формирование портфолио — стр. 22–23
9. Итоговый контроль знаний — стр. 24–25
10. Управление бюджетом — стр. 26–27
11. Заинтересованные стороны — стр. 28–29
12. Управление знаниями — стр. 30–31
13. Подготовка к защите — стр. 32–33

Нормативные ссылки и источники

[1] Bossburgeoff/Mafia. Репозиторий GitHub. https://github.com/Bossburgeoff/Mafia/tree/293145e5ccad1769a9d3668e132ef72c31b5c82f (просмотр 19.10.2026).
[2] Техническое задание проекта. Файл Technical Specification в репозитории [1]. https://github.com/Bossburgeoff/Mafia/blob/293145e5ccad1769a9d3668e132ef72c31b5c82f/Technical%20Specification
[3] Методические указания к практическим занятиям 1–13. МДК 02.02 «Управление проектами». Приложены к заданию; преподаватель Мифтахов Н.И.
[4] ГОСТ 19.101-2024. ЕСПД. Виды программ и программных документов. https://protect.gost.ru/gost/details/5cee0533-a1f4-41fe-bcb3-bc79e7e74490
[5] ГОСТ 19.105-78. ЕСПД. Общие требования к программным документам. https://protect.gost.ru/gost/details/500f8c05-0b04-40fc-a049-4212eae807c3
[6] ГОСТ 19.106-78. ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом. Перечень стандартов: https://www.standards.ru/collection.aspx?catalogid=temat-sbor&control=40&id=868075
[7] ГОСТ 19.102-77. ЕСПД. Стадии разработки. Перечень стандартов: тот же каталог, что в [6].
[8] ГОСТ 19.201-78. ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. https://www.swrit.ru/doc/espd/19.201-78.pdf
[9] ГОСТ 19.301-79. ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. https://protect.gost.ru/gost/details/b25e0645-091a-425b-8558-3e0c3ce37315
[10] ГОСТ 19.404-79. ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. https://www.hse.ru/data/2019/02/05/1204916447/ГОСТ_19.404-79%20ПЗ.pdf
[11] ИТС31_Коновалов_ЛР1-ЛР9_Мафия_ЕСПД (2).docx. Предоставленный образец оформления.
[12] Презентация команды: mafia_project_presentation_team.pptx в корне репозитория [1], 10 слайдов.
[13] ГОСТ 19.505-79. ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. https://protect.gost.ru/gost/details/07fec7b0-024f-407f-b5a8-7ebfe7cfa0a9

Примечание. Для видов документов учтён ГОСТ 19.101-2024, действующий в РФ с 30.01.2025. Старое обозначение 19.101-77 в исходных материалах не воспроизводится как актуальная редакция. Даты и сроки учебных планов требуют согласования с расписанием.

1 Практическая работа № 1. Создание проекта

МДК 02.02 «Управление проектами» • ИТС-31 • Коновалов • 19.10.2026

1.1 Цель, исходные данные и конфигурация

Цель работы — определить организацию проекта «Мафия», очередь задач, роли участников и правила доступа. Основание: методические указания к ПР1 [3], ТЗ проекта [2]. Стадии разработки сопоставлены с ГОСТ 19.102-77 [7]; требования к результату — с ГОСТ 19.201-78 [8].

Проверен репозиторий https://github.com/Bossburgeoff/Mafia, ревизия 293145e от 16.10.2026 [1]. Проект предназначен для автоматизации проведения партии: лобби, роли, фазы, голосование, управление ведущим, журнал и коммуникации. Срок по ТЗ — I семестр 2026/2027 учебного года.

Элемент	**Принятое проектное решение**
Название / очередь	Мафия / MAF
Типы	Эпик; задача; баг; документ; тест
Статусы	Открыта → В работе → На проверке → Готово → Принята
Готово	Есть результат и проведена проверка исполнителем
Принята	Результат проверен руководителем по критериям ТЗ
Права	Администратор — руководитель; рабочие — участники; чтение — рецензент

1.2 Состав участников и права

Обозначения	**Количество**	**Ответственность**
Я1–Я3	3	Команда «Ядро»: цикл и голосование
И1–И3	3	«Интерфейс»: лобби, роли, панель
Д1–Д3	3	«Данные»: журнал и коммуникации
Р1	1	Сквозная координация проекта
Р2	1	Технический писатель и сборка

Это обозначения 11 мест по ТЗ, а не подтверждённый поимённый состав. Преподаватель и руководитель по ТЗ — Мифтахов Н.И. Соответствие ФИО обозначениям и реальные права трекера требуют подтверждения. Приглашения и настройки внешнего трекера не выполнялись.

1.3 Начальный реестр и подтверждение результата

Предлагается перенести в трекер первые 10 задач. Полная декомпозиция приведена в ПР2; отдельные карточки аналитических работ ниже относятся к подготовке, а не увеличивают 60 задач функционального бэклога.

ID	Содержание / результат	Роль / срок
ORG-01	Согласовать ТЗ / перечень требований	Р1 / нед. 2
ORG-02	DFD / согласованы потоки	Я1 / нед. 3
ORG-03	ER-модель / ключи и связи	Д1 / нед. 3
ORG-04	UML / описаны взаимодействия	Я2 / нед. 4
ORG-05	Макет / показаны ключевые экраны	И1 / нед. 4
ORG-06	Репозиторий / доступ к исходникам	Р1 / нед. 1
ORG-07	Тест-кейсы / задан ожидаемый результат	Я3 / нед. 4
ORG-08	Реестр документов / версии и владельцы	Р2 / нед. 4
ORG-09	План / зависимости и вехи	Р1 / нед. 2
ORG-10	Сборка / инструкция локального запуска	Р2 / нед. 6

Ссылка на трекер и снимки его настроек не предоставлены. Они не заменяются изображениями интерфейса игры; конфигурация выше представляет проектное решение.

Ответы на контрольные вопросы

1) СУП объединяет задачи, сроки и ответственность. 2) Проект задаёт общий результат, очередь хранит карточки. 3) Тип отражает назначение и критерии проверки. 4) Пять статусов разделяют выполнение, проверку и приёмку. 5) Администратор управляет доступом и настройками. 6) Без исполнителя задача остаётся без персональной ответственности.

Чек-лист приёмки и вывод

Подтверждено: исходники и ТЗ доступны. Подготовлено: конфигурация и стартовый реестр. Не подтверждено: ссылка на трекер, приглашения и скриншоты его настроек.

Вывод. Разработана схема управления проектом; внедрение в реальный трекер остаётся отдельным организационным действием.

2 Практическая работа № 2. Управление задачами проекта

МДК 02.02 «Управление проектами» • ИТС-31 • Коновалов • 19.10.2026

2.1 Принцип декомпозиции и распределение нагрузки

Цель — сформировать управляемый бэклог с критериями готовности, исполнителями, оценками и зависимостями. Семь эпиков соответствуют семи модулям ТЗ [2]. Записи являются предложением для импорта, а не выгрузкой существующего трекера; его ссылка и снимок фильтра по исполнителям не предоставлены.

Эпик	**Задач**	**План, ч**
Лобби	9	27
Роли	9	27
Игровой цикл	9	27
Голосование	9	27
Панель ведущего	8	23
Журнал и статистика	8	23
Коммуникации	8	22
Итого	60	176

Роль	**Задач**	**Часы**	**Роль**	**Задач**	**Часы**
Я1	6	12	И1	7	14
Я2	6	18	И2	8	24
Я3	6	24	И3	8	32
Д1	6	12	Р1	2	4
Д2	5	14	Р2	2	6
Д3	4	16	—	—	—

Каждая задача имеет одного ответственного. На следующих листах: В — высокий, С — средний приоритет; Н — учебная неделя; М3 — разработка, М4 — стабилизация. Предшественник указан в последнем столбце; «—» означает начало цепочки эпика. Оценки выражены в человеко-часах. Обозначения ролей раскрыты в ПР1.

Сквозная обязательная последовательность: создание комнаты → состав игроков → раздача ролей → фазы → голосование → итог → запись истории. Календарный критический путь определяется не суммой оценок карточек, а сетью зависимостей и доступностью ресурсов (ПР3).

Чек-лист приёмки и вывод

Подготовлено: 7 эпиков, 60 задач, 11 условных исполнителей, критерии, оценки и зависимости. Не подтверждено: создание карточек и фактическое распределение по ФИО.

Вывод. Бэклог на 176 ч согласован со статьёй «Разработка» учебной сметы ПР10; CSV приложен в архиве.

2.2 Бэклог: задачи 1–20

ID MAF	Задача и критерий готовности	Роль	ч	Пр.	Н/веха	После
001	Создать комнату — комната получает код	Р1	2	В	7/М3	—
002	Вход по коду — существующий код открывает лобби	И2	3	В	7/М3	001
003	Проверить вместимость — переполнение отклоняется	И3	4	С	7/М3	002
004	Список игроков — состав обновляется	И1	2	В	8/М3	003
005	Приватность — закрытая комната скрыта	И2	3	С	8/М3	004
006	Выход из комнаты — участник удаляется	И3	4	С	8/М3	005
007	Повторное подключение — идентичность сохранена	И1	2	С	9/М3	006
008	Проверить ввод — пустое имя отклоняется	И2	3	С	9/М3	007
009	Проверить лобби — негативные сценарии записаны	И3	4	С	13/М4	008
010	Состав колоды — число карт равно числу игроков	Р1	2	В	7/М3	004
011	Перемешать роли — каждому выдана одна роль	И2	3	В	7/М3	010
012	Показать личную роль — видна только своя карта	И3	4	С	7/М3	011
013	Скрыть чужие роли — сервер не отдаёт секреты	И1	2	В	8/М3	012
014	Порог старта — менее 6 игроков отклоняются по ТЗ	И2	3	С	8/М3	013
015	Доктор — защита учитывается ночью	И3	4	С	8/М3	014
016	Комиссар — результат видит владелец	И1	2	С	9/М3	015
017	Мафия и Дон — цель применяется один раз	И2	3	С	9/М3	016
018	Проверить роли — есть тесты для 6 и 20 игроков	И3	4	С	13/М4	017
019	Задать фазы — ночь сменяется днём	Я1	2	В	7/М3	011
020	Таймер — отсчёт не уходит ниже нуля	Я2	3	В	7/М3	019

Источник требований: ТЗ [2]; декомпозиция и оценки составлены для отчёта. Для MAF-014 критерий 6 игроков принят из нижней границы ориентировочного диапазона ТЗ; в исходном HTML фактический порог равен 4, решение требует согласования.

2.3 Бэклог: задачи 21–40

ID MAF	Задача и критерий готовности	Роль	ч	Пр.	Н/веха	После
021	Пауза — время не меняется	Я3	4	C	7/M3	020
022	Продолжить — отсчёт возобновляется	Я1	2	B	8/M3	021
023	Автопереход — ноль запускает переход	Я2	3	C	8/M3	022
024	Ночное действие — доступно нужной роли	Я3	4	C	8/M3	023
025	Номер раунда — увеличивается после голосования	Я1	2	C	9/M3	024
026	Победа — определена победившая сторона	Я2	3	C	9/M3	025
027	Восстановить состояние — перезагрузка не ломает фазу	Я3	4	C	13/M4	026
028	Выбрать цель — выбирается живой игрок	Я1	2	B	7/M3	019
029	Записать голос — голос входит в подсчёт	Я2	3	B	7/M3	028
030	Запретить повтор — второй голос отклоняется	Я3	4	C	7/M3	029
031	Воздержание — null учитывается однократно	Я1	2	B	8/M3	030
032	Подсчитать итоги — частоты совпадают с голосами	Я2	3	C	8/M3	031
033	Обработать ничью — никто не исключён	Я3	4	C	8/M3	032
034	Исключить игрока — статус alive меняется	Я1	2	C	9/M3	033
035	Ограничить фазу — днём голос недоступен	Я2	3	C	9/M3	034
036	Проверить голосование — повтор и ничья покрыты	Я3	4	C	13/M4	035
037	Установить ведущего — в комнате один ведущий	И1	2	B	7/M3	001
038	Проверить полномочия — чужое управление отклоняется	И2	3	B	7/M3	037
039	Запуск партии — раздача производится однократно	И3	4	C	7/M3	038
040	Следующая фаза — переход доступен ведущему	И1	2	B	8/M3	039

Источник требований: ТЗ [2]; декомпозиция и оценки составлены для отчёта. Для MAF-014 критерий 6 игроков принят из нижней границы ориентировочного диапазона ТЗ; в исходном HTML фактический порог равен 4, решение требует согласования.

2.4 Бэклог: задачи 41–60

ID MAF	Задача и критерий готовности	Роль	ч	Пр.	Н/веха	После
041	Пауза партии — всем виден один статус	И2	3	C	8/M3	040
042	Ручная корректировка — изменение записано в журнал	И3	4	C	8/M3	041
043	Завершить партию — есть итоговая запись	И1	2	C	9/M3	042
044	Исправить инициализацию — нет обращения к отсутствующим DOM-узлам	Р2	3	C	13/M4	043
045	Журнал событий — у события есть время	Д1	2	B	7/M3	028
046	История партий — запись сохраняется	Д2	3	B	7/M3	045
047	Статистика профиля — счётчики обновляются	Д3	4	C	7/M3	046
048	Экспорт CSV — заголовок и строки читаются	Д1	2	B	8/M3	047
049	Экранировать CSV — кавычки удваиваются	Д2	3	C	8/M3	048
050	Хранить состояние — данные переживают перезагрузку	Д3	4	C	8/M3	049
051	Обработать повреждение — JSON-ошибка не обрушает чтение	Д1	2	C	9/M3	050
052	Проверить данные — экспорт сверяется с историей	Р2	3	C	13/M4	051
053	Отправить сообщение — сообщение видно в комнате	Д1	2	B	7/M3	001
054	Экранировать HTML — разметка отображается текстом	Д2	3	B	7/M3	053
055	Ограничить историю — лимит сообщений соблюдается	Д3	4	C	7/M3	054
056	Уведомления — видны ошибки и события	Д1	2	B	8/M3	055
057	WebSocket hello — сервер подтверждает протокол	Д2	3	C	8/M3	056
058	Синхронизировать комнату — два клиента видят одно состояние	Д3	4	C	8/M3	057
059	Восстановить связь — выход и вход обрабатываются	Д1	2	C	9/M3	058
060	Проверить связь — зафиксированы сетевые сценарии	Д2	2	C	13/M4	059

Источник требований: ТЗ [2]; декомпозиция и оценки составлены для отчёта. Для MAF-014 критерий 6 игроков принят из нижней границы

ориентировочного диапазона ТЗ; в исходном HTML фактический порог равен 4, решение требует согласования.

Ответы на контрольные вопросы

1) Декомпозиция делит результат на проверяемые работы. 2) Эпик объединяет задачи одного направления. 3) Нужны результат, критерий, оценка и срок. 4) Один ответственный обеспечивает персональную приёмку. 5) Оценка позволяет проверить загрузку до начала работы. 6) Критический путь — длиннейшая цепь с нулевым полным резервом.

3 Практическая работа № 3. Планирование проекта

МДК 02.02 «Управление проектами» • ИТС-31 • Коновалов • 19.10.2026

3.1 WBS, методы оценки и ресурсы

Цель — составить WBS и календарный план на 16 учебных недель. Стадии определены с учётом ГОСТ 19.102-77 [7]; пять учебных вех не являются дословной заменой стадий ЕСПД. Начало 07.09.2026 принято для расчётного плана; расписание колледжа не предоставлено.

WBS / этап	Пакеты работ	Экспертно, ч	Аналог, ч
1 Аналитика	Требования, DFD, критерии	24	28
2 Проектирование	ER, UML, интерфейс	24	28
3 Разработка	7 эпиков ПР2	176	184
4 Стабилизация	Тесты, исправления	48	44
5 Документация	Реестр, инструкции, портфолио	32	28
6 Защита	Доклад и демонстрация	16	18
Итого	Все пакеты	320	330

Использованы два учебных метода: экспертная декомпозиция снизу вверх и оценка по аналогии с похожими браузерными прототипами. Значения не являются результатом опроса команды. Для базового плана выбрана оценка 320 ч; отличие альтернативы — 10 ч (3,1 % от базовой оценки). Документирование распределено по этапам и не создаёт отдельную последовательную задержку.

Ресурс	План, ч	Принятая доступность	Запас
«Ядро», 3 участника	96	3 × 16 × 2 = 96 ч	0
«Интерфейс», 3 участника	96	96 ч	0
«Данные», 3 участника	80	96 ч	16 ч
P1: координация	24	32 ч	8 ч
P2: документы и сборка	24	32 ч	8 ч
Итого	320	352 ч	32 ч

Доступность принята по 2 астрономических часа в неделю на участника; это отдельное допущение, а не пересчёт 2 академических часов занятия. Самая высокая нагрузка по функциональному бэклогу у И3 — 32 ч; у команд «Ядро» и «Интерфейс» нет группового резерва. Часть тестов допустимо передать команде «Данные».

3.2 Календарный план и критический путь

Код	Работа	Длит., нед.	После	Ранний интервал	Резерв, нед.
A	Аналитика	2	—	1–2	0
B	Проектирование	2	A	3–4	0
C	Ядро	5	B	5–9	0

Код	Работа	Длит., нед.	После	Ранний интервал	Резерв, нед.
D	Интерфейс	4	B	5–8	1
E	Данные и связь	4	B	5–8	1
F	Интеграция	2	C,D,E	10–11	0
G	Стабилизация	3	F	12–14	0
H	Защита	2	G	15–16	0

Диаграмма Ганта (учебные недели 1–16)

Работа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A Аналитика	■	■	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B Проектирование	·	·	■	■	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
C Ядро	·	·	·	·	■	■	■	■	■	·	·	·	·	·	·	·
D Интерфейс	·	·	·	·	■	■	■	■	·	·	·	·	·	·	·	·
E Данные и связь	·	·	·	·	■	■	■	■	·	·	·	·	·	·	·	·
F Интеграция	·	·	·	·	·	·	·	·	·	■	■	·	·	·	·	·
G Стабилизация	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	■	■	■	·	·
H Защита	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	■	■

Критический путь A → B → C → F → G → H: 2 + 2 + 5 + 2 + 3 + 2 = 16 недель. Резерв D и E — по 1 неделе. Интеграция F начинается после завершения C, D и E; документы готовятся параллельно.

Веха	Результат	Дата по модели
M1 / нед. 2	Аналитика завершена	20.09.2026
M2 / нед. 4	Проектирование завершено	04.10.2026
M3 / нед. 11	Разработка и интеграция	22.11.2026
M4 / нед. 14	Стабилизация	13.12.2026
M5 / нед. 16	Защита	27.12.2026

Ответы на контрольные вопросы

1) WBS описывает весь состав работ. 2) Детализация достаточна, когда результат можно оценить и принять. 3) Веха имеет нулевую длительность. 4) Задержка критической цепи сдвигает финиш. 5) Применены экспертная оценка и аналогия. 6) При отставании нужно перераспределить ресурсы или согласовать сокращение объёма.

Чек-лист приёмки и вывод

Составлено: WBS, две оценки, сеть, Гант, резервы, пять вех. Календарь требует утверждения преподавателем.

Вывод. При принятых ресурсах модель помещается в 16 недель, но критическая цепь не имеет календарного резерва.

4 Практическая работа № 4. Мониторинг и контроль

МДК 02.02 «Управление проектами» • ИТС-31 • Коновалов • 19.10.2026

4.1 Метрики и фактическая проверка ревизии

Цель — определить контрольные показатели и провести ограниченную проверку проекта. Проверка исходного HTML выполнена 19.10.2026 в Chromium, на ревизии 293145e [1]. В отличие от программы приёмочных испытаний по ГОСТ 19.301-79 [9], этот прогон не подтверждает 10 завершённых партий и сетевую эксплуатацию.

Показатель	**Правило / источник**	**Ответственный / частота**
Выполнение объёма	Принятые задачи / 60 × 100 %; трекер	P1 / занятие
Соблюдение сроков	Задачи в срок / завершённые с плановой датой	P1 / неделя
Остаток работы	Незакрытые задачи; единый базовый объём	Секретарь / занятие
Открытые дефекты	По уникальным ID и критичности	Тестировщик / занятие
Трудозатраты	Сумма записей личных журналов, ч	P2 / неделя

Проверка	**Результат**
Загрузка HTML	Страница открывается, но есть ошибка JS
Создание комнаты / порог старта	Комната создана; один игрок не допускается
Добавление ботов кнопкой	Не работает в проверенной исходной загрузке
Старт на 6 игроках	Флаг раздачи ролей установлен на подготовленных данных
Пауза / CSV	Обработчик паузы меняет флаг; CSV скачивается
Повторное воздержание	Два действия записываются в журнал — дефект

Тестовые 6 игроков добавлены в состояние программно; проверка старта не доказывает исправность кнопки ботов. Пауза, повторное воздержание и экспорт проверены вызовом обработчиков; это белоящичная проверка, а не полноценный пользовательский или сетевой сценарий.

Регламент сверки и запись анализа

Предлагается 10 минут в конце занятия: «сделано — план — блокеры». Секретарь P2 записывает решения, P1 назначает ответственных. Запись анализа 19.10.2026: найдены два дефекта D-01, D-02; нужны исправление и повторный прогон. Это запись технического анализа, не протокол реально проведённого командного стендапа.

Ответы на контрольные вопросы

1) Мониторинг собирает данные, контроль выбирает действие. 2) Выбраны объём, сроки, остаток, дефекты и часы. 3) Сгорание показывает незавершённый объём во времени. 4) Три вопроса выявляют результат, намерение и препятствие. 5) Критичность определяется резервом и зависимостями. 6) Можно перераспределить работу и согласовать необязательные функции.

4.2 Диаграмма сгорания и корректирующие действия

Поскольку выгрузка трекера отсутствует, далее показана учебная модель на 60 задач. Столбец «сценарий» нельзя использовать как подтверждение фактического прогресса команды.

Точка	Плановый остаток	Сценарий	Сценарий − план
0	60	60	0
1	56	57	1
2	52	54	2
3	48	52	4
4	44	48	4
5	40	45	5

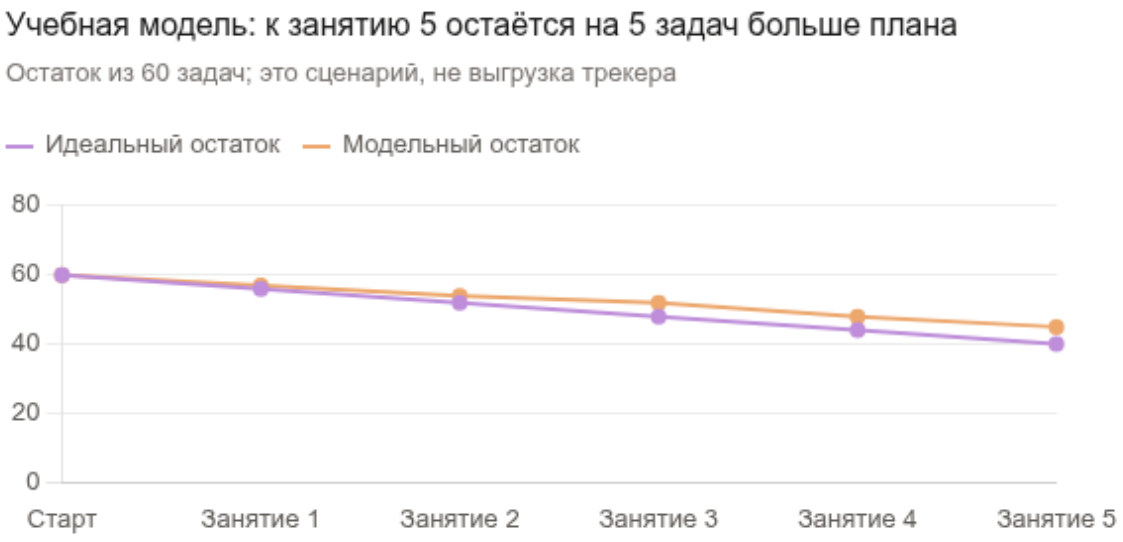


Рисунок 1 — Учебная диаграмма сгорания: условные занятия 0–5, единица — задача.

Проблема	Влияние / действие
D-01: отсутствуют soundSetting и motionSetting, строка 781	Инициализация обрывается; согласовать DOM и JS, затем повторить запуск и ботов
D-02: проверка r.votes[name] пропускает null	Повторное воздержание; проверять наличие ключа через Object.hasOwn
Учебный сценарий: +5 задач к плану	Если затронут C или F — критический путь; передать тесты свободному ресурсу, отложить декор

Проблема	Влияние / действие
Нет сервера и сетевого протокола испытаний	Сетевая приёмка блокирована; поставить отдельную интеграционную задачу

Чек-лист приёмки и вывод

Выполнено: локальный анализ и учебная диаграмма. Нет: реального ряда трекера и командного стендапа.

Вывод. Реальная готовность не доказана: сначала необходимо исправить D-01 и D-02 и повторить испытания.

5 Практическая работа № 5. Управление документацией

МДК 02.02 «Управление проектами» • ИТС-31 • Коновалов • 19.10.2026

5.1 Реестр, версии и комплектность

Цель — проверить состав программной документации. Виды документов определяются ГОСТ 19.101-2024 [4], общие требования — ГОСТ 19.105-78 [5]. Для пояснительной записки использован ГОСТ 19.404-79 [10]. Реестр ниже фиксирует наличие, а не факт утверждения.

Документ / источник	Состояние	Версия / владелец
ТЗ: Technical Specification [2]	Есть; текст без указанного номера версии	293145e / P1
README.md [1]	Пустой; не является инструкцией	293145e / P2
Отчет МДК 02.01.docx [1]	Файл есть; отдельная приёмка не проводилась	293145e / P2
Образец ЛР1–ЛР9 [11]	Предоставлен; использован как стиль	Входной файл / автор
Презентация команды [12]	Есть 10 слайдов; не акт защиты	293145e / команда
Тесты и SQL, архив [1]	Архив есть; содержимое требует ревизии	293145e / команда
Руководство оператора	Отдельный утверждённый документ не найден	Подготовить / P2
ПМИ и протокол 10 партий	Подтверждающий протокол не предоставлен	Подготовить / тестировщик
Отчёты ПР1–ПР13	Составлен настоящий комплект	1.0 / Коновалов

Место хранения исходных материалов — репозиторий [1]. Идентификатор 293145e здесь обозначает срез хранилища, а не формально присвоенную версию каждого документа. Сокращённые обозначения рабочих файлов не выдаются за полные обозначения ЕСПД.

Правила изменения

Предлагается схема X.Y: X — согласованное изменение требований или структуры; Y — уточнения без смены назначения. История хранится в Git. Изменение сопровождается номером задачи, автором, датой и причиной; предыдущий вариант не удаляется. Реестр должен содержать ID, название, версию, дату, владельца, состояние и ссылку.

5.2 Замечания и порядок устранения

Замечание	Действие	Состояние
README не содержит текста	Добавить запуск, ограничения, ссылки	Предложено; репозиторий не изменён
Не указан выпуск ТЗ	Зафиксировать версию и ответственного	Требует согласования

Замечание	Действие	Состояние
Не доказана сетевая готовность	Разделить описание клиента и сервера	Уточнено в этом отчёте
В образце есть ГОСТ 19.101-77	Для нового перечня учесть 19.101-2024	Учтено в нормативных ссылках
Нет утверждённой комплектности	Согласовать перечень по ТЗ	Подготовлен реестр
Нет протокола 10 партий	Провести и зарегистрировать испытания	Не выполнено

Состав и оформление настоящего комплекта

Сохранены основные признаки образца: титульный лист колледжа, дисциплина, группа, сведения о документе, последовательная нумерация работ, цели, таблицы, чек-листы и выводы. Формат А4; поля: слева 30 мм, справа 15 мм, сверху и снизу 20 мм; основной шрифт Times New Roman, 12 пт. Компактные реестры набраны меньшим кеглем.

Эти параметры выбраны для сходства с предоставленным образцом. Они не объявляются универсальными предписаниями ГОСТ 19. Нормативные документы ЕСПД регулируют состав и содержание программных документов; таблицы управления проектом оформлены как учебные материалы.

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Основание / изменение	Автор
1.0	19.10.2026	Первое составление комплекта ПР1–ПР13	Коновалов

Ответы на контрольные вопросы

1) Документация обеспечивает воспроизводимость и сопровождение. 2) Реестр учитывает версии, состояние и владельцев. 3) X меняется при существенной переработке, Y — при уточнениях. 4) Старые версии нужны для проверки причин изменений. 5) ТЗ, ПМИ и руководства имеют профильные ГОСТ; план и стендап — учебный формат. 6) Сквозной владелец — технический писатель, согласование — руководитель.

Чек-лист приёмки и вывод

Проверено наличие файлов; составлен реестр и замечания. Исходные документы не редактировались.

Вывод. Комплект найден частично; формальная готовность требует согласования версий, руководства и ПМИ.

6 Практическая работа № 6. Интеграция инструментов

МДК 02.02 «Управление проектами» • ИТС-31 • Коновалов • 19.10.2026

6.1 Инструментальный контур

Цель — описать связь задач, исходников, документов и ревью. Регламент ТЗ [2] требует feature-ветки и pull request с ревью. История Git доступна, но экспорт карточек и настройки интеграции отсутствуют. ГОСТ 19.105-78 [5] использован для требований к документированию результатов; он не регламентирует настройку GitHub.

Инструмент	Назначение	Ручная операция / статус
Git / GitHub	Версии и обсуждение изменений	Есть история коммитов; приёмка PR не проверена
Трекер MAF	Задачи и исполнители	Предлагается; связь не подтверждена
DOCX / PDF	Отчёты и документы	Версии сопоставляются по реестру
Браузер Chromium	Локальная проверка клиента	Протокол сохранён в архиве
Общее хранилище	Актуальные версии документов	В задаче должна быть ссылка, не копия

Предлагаемая схема

Карточка MAF-001 → feature/lobby-MAF-001 → коммит «MAF-001: создать комнату» → pull request со ссылкой на карточку → ревью → проверка → «Готово» → приёмка руководителем → «Принята». Документ привязывается ссылкой на файл в конкретной ревизии, а для навигации добавляется ссылка на актуальный реестр.

Уведомления и безопасность

Участнику — назначение, блокировка и возврат с проверки; рецензенту — новый PR; руководителю — просрочка вехи и критический дефект. Сроки проверяются раз в день, информационные изменения группируются. Токены не размещаются в коде и отчёте. Принятие PR не должно автоматически означать приёмку всей функции без теста.

Наблюдение по истории

В доступной истории встречаются сообщения «Add files via upload» без номера задачи [1]. Это не доказывает отсутствие трекера, но не обеспечивает требуемую прослеживаемость само по себе. Скриншоты настроек интеграции и карточки с коммитом не предоставлены и не подменяются макетами.

6.2 Протокол проверки и регламент

Шаг контура	Способ проверки	Фактический статус
Задача → ветка	Открыть карточку и URL ветки	Не проверено: нет доступа к трекеру
Ветка → коммит	Сопоставить SHA и историю	Коммиты доступны; связь с задачами не доказана
Коммит → PR	Проверить ссылку и diff	Не проверено в рамках отчёта

Шаг контура	Способ проверки	Фактический статус
PR → ревью	Посмотреть автора и решение	Не подтверждено
Ревью → закрытие	Принять тест, затем закрыть задачу	Не подтверждено
Документ → исходник	Открыть версию по SHA	Используется срез 293145e

Протокол от 19.10.2026 фиксирует проверку доступных материалов, а не успешно настроенную интеграцию. Для завершения ПР6 необходимо выполнить реальный сквозной цикл в выбранном трекере и приложить два скриншота: настройки связи и карточка с коммитом.

Краткий регламент

1. Р1 утверждает задачу и критерий готовности. 2. Исполнитель создаёт ветку feature/<модуль>-<ID>. 3. Каждый содержательный коммит содержит ID. 4. Обсуждение реализации ведётся в PR, требований — в карточке. 5. Ревью выполняет другой участник. 6. Документы сохраняются по одному адресу, изменения — в Git. 7. Закрытие задачи производится после теста и приёмки.

Ручная работа, которую можно устранить

После настройки интеграции не потребуется копировать сообщения коммитов в карточки, пересылать новые версии документов и вручную сообщать о каждом PR. В текущем отчёте устранение этой работы не подтверждено, поскольку интеграция не внедрялась.

Ответы на контрольные вопросы

1) Интеграция уменьшает рассогласование данных. 2) ID в сообщении и ссылка в PR связывают результат с задачей. 3) Одна ссылка предотвращает расхождение копий. 4) Полезны назначения, блокеры и ревью; шум — каждое сохранение. 5) Без связи теряется история решений и вклад. 6) Проверяется полный маршрут от карточки до приёмки.

Чек-лист приёмки и вывод

Подготовлены схема и регламент. Фактическая настройка связи и уведомлений не подтверждена.

Вывод. Определён проверяемый контур; успешное внедрение нельзя заявить без испытания на реальной карточке.

7 Практическая работа № 7. Презентация результатов

МДК 02.02 «Управление проектами» • ИТС-31 • Коновалов • 19.10.2026

7.1 План выступления и подтверждённые показатели

Цель — подготовить представление текущего результата без преувеличения готовности. В репозитории есть mafia_project_presentation_team.pptx: 10 слайдов [12]. Это укладывается в диапазон 10–15 слайдов ПР7. Факт выступления и обратная связь аудитории не подтверждены.

Слайд	Тема	Уточнение для доклада
1	Название проекта	Команда, дисциплина, версия
2	Идея	Автоматизация настольной игры
3	Цель и задачи	Сопоставить с ТЗ
4	Дизайн и UX	Адаптивный браузерный интерфейс
5	Основные функции	Разделить код и проверенные сценарии
6	Технологии	HTML, CSS, JavaScript, localStorage
7	Командная работа	Подтвердить личный вклад
8	Трудности	Показать D-01 и D-02
9	Развитие	Сервер и синхронизация не включены
10	Итог	Ограничения и следующие шаги

Показатель	**Значение / основание**
Модулей по ТЗ	7; не доля готовности
Вариантов HTML в корне	3; основной и два альтернативных
Размер основного HTML	6 257 421 байт
Слайдов в презентации	10; проверено чтением PPTX
Коммитов доступной истории	14; полученная история Git
Мест участников по ТЗ	11; поимённый состав не подтверждён
Подтверждённых классов дефектов	2: инициализация, повторное воздержание

Процент закрытых задач, соблюдение сроков и фактические часы не названы: трекер и журналы отсутствуют. Метрики получены из файлов и истории, а не из учебного сценария ПР4.

7.2 Сценарий демонстрации и обратная связь




Рисунок 2 — Главный экран исходного клиента Mafia. Реальный локальный снимок, не макет.

Время	Действие
0:00–0:40	Представить цель, ревизию и ограничения
0:40–1:30	Открыть HTML, показать навигацию
1:30–2:20	Создать комнату и показать код
2:20–3:10	Показать ошибку инициализации и D-01
3:10–4:00	Объяснить роли, историю и границы локальной демонстрации
4:00–4:30	Показать план исправлений и ответить на вопрос

До устранения D-01 нельзя обещать непрерывную демонстрацию с ботами. Резервный вариант — сохранённые снимки и исходный код с комментариями о том, что не проверено. Роли выступления предлагаются: Р1 — цель и план, представитель интерфейса — показ, команда ядра — логика, Р2 — документация.

Реестр замечаний технического анализа

Приняты к дальнейшему рассмотрению: устранить D-01; исправить D-02; явно отметить отсутствие сервера; дополнить доклад реальными метриками трекера после их получения. Это замечания анализа, а не отзывы с состоявшегося выступления. Форма обратной связи: автор, раздел, замечание, приоритет, решение, ответственный.

Ответы на контрольные вопросы

1) Доклад включает цель, решение, доказательства, ограничения и план. 2) Цифры проверяемы, общие оценки — нет. 3) Сценарий удерживает время, резерв спасает показ. 4) За участок отвечает его исполнитель. 5) При отказе перейти к резерву и назвать ограничение. 6) Письменный отзыв можно превратить в задачу.

Чек-лист приёмки и вывод

Проверены 10 слайдов, подготовлены сценарий и форма. Выступление и обратная связь не подтверждены.

Вывод. Материалы подходят для промежуточного показа после честного обозначения обнаруженных дефектов.

8 Практическая работа № 8. Формирование портфолио

МДК 02.02 «Управление проектами» • ИТС-31 • Коновалов • 19.10.2026

8.1 Структура и каталог портфолио

Цель — собрать навигацию по проверяемым артефактам. Основание: ПР8 [3], перечень программных документов по ГОСТ 19.101-2024 [4]. Портфолио — учебная подборка, а не самостоятельный вид программного документа ЕСПД.

Раздел / владелец	Артефакт	Версия / состояние
01 Требования / Р1	Technical Specification [2]	293145e; файл найден
02 Модели / команды	Образец ЛР1–ЛР9 [11]	Входной DOCX; не акт приёмки
03 Код / команды	Mafia-2026-Adaptive.html [1]	293145e; исходник проверен
04 Тесты / тестировщик	Архив тестов [1]; протокол анализа	Архив найден; новый локальный протокол приложен
05 Управление / Р1	Настоящий комплект и бэклог	1.0; учебные планы
06 Показ / команда	mafia_project_presentation_team.pptx [12]	293145e; 10 слайдов
07 Личный вклад / автор	Задачи, коммиты, журнал	Не подтверждён исходными данными

Сопроводительная записка

Портфолио представляет учебный проект браузерного приложения «Мафия». Просмотр начинается с ТЗ, затем переходят к моделям, исходникам, проверкам и управленческим материалам. Для исходных файлов используется единая ревизия Git. Учебные расчёты настоящего отчёта хранятся отдельно от доказательств выполнения.

Навигация и имена

Рекомендуемая схема: 00_Оглавление → 01_Требования → 02_Модели → 03_Код → 04_Проверки → 05_Управление → 06_Демонстрация → 07_Личный_вклад. Имя файла: ИТС31_Коновалов_ПР<номер>_v1.0.docx. В архиве отчёта отдельные файлы названы по шаблону методичек без суффикса версии; версия указана внутри.

Оригинальная папка командного портфолио и её скриншот не предоставлены. Настоящий каталог не выдаётся за снимок ранее созданного портфолио.

8.2 Полнота работ и личный раздел

Группа работ	Количество	Доказательство / ограничение
ЛР1–ЛР9	9	Есть предоставленный комплект-образец; индивидуальная сдача не проверена
ПР1–ПР8	8	Включены в настоящий отчёт; внешние действия требуют подтверждения

Группа работ	Количество	Доказательство / ограничение
ПР10–ПР13	4	Включены планы, расчёты и подготовительные материалы
Проектные работы: всего	21	9 ЛР + 12 ПР; наличие документа не равно приёмке
ПР9	1	Отдельная теоретическая работа; в число 21 не входит

Личный раздел Коновалова

Предлагаемый состав: 1) роль и границы ответственности; 2) перечень личных карточек с URL; 3) коммиты с SHA; 4) журнал «дата — задача — результат — часы»; 5) собственные документы; 6) краткие выводы. Подготовка данного комплекта не подтверждает авторство всех файлов репозитория. Соответствие аккаунта GitHub конкретному участнику без проверки не устанавливалось.

Критерии достоверности

Артефакт считается подтверждённым по существованию при наличии доступного исходного файла и ревизии. Авторство подтверждают история изменений и карточка исполнителя. Принятие — решение руководителя. Эти три признака учитываются раздельно. Материал без проверяемого источника переносится в раздел «проектное предложение», а не включается в личные достижения.

Проверка комплекта

Выявлены пробелы: нет выгрузки задач, личных журналов, реального протокола демо-дня, сетевого сервера и протокола 10 партий. Для каждого пробела назначается владелец и срок перед защитой; отсутствие отмечается явно. Ссылки на исходные артефакты приведены в источниках [1], [2], [11], [12].

Ответы на контрольные вопросы

1) Портфолио объединяет артефакты, отчёт объясняет работу. 2) Оно показывает проверяемые навыки студента. 3) Личный раздел содержит роль, задачи, коммиты и журнал. 4) Источник подтверждает существование и происхождение. 5) Удобны нумерованные разделы и единый каталог. 6) Неподтверждённый материал нельзя выдавать за личный результат.

Чек-лист приёмки и вывод

Подготовлены каталог, правила навигации и таблица полноты. Личный вклад и сдача 21 работы не подтверждены.

Вывод. Структура портфолио готова; доказательную часть нужно дополнить данными команды.

9 Практическая работа № 9. Итоговый контроль знаний

МДК 02.02 «Управление проектами» • ИТС-31 • Коновалов • 19.10.2026

9.1 Теоретическая подготовка и лист самопроверки

Цель — систематизировать теорию управления проектами. По методическим указаниям ПР9 не привязана к проекту «Мафия», выполняется индивидуально за 40 минут и оценивается отдельно [3]. Ниже приведены подготовительные ответы, а не результат официального тестирования.

Тема	Краткий ответ
Проект	Временная деятельность ради уникального результата при ограничениях
Проект и операции	У проекта есть завершение; операции поддерживают повторяемую деятельность
PRINCE2	Метод управления с обоснованием целесообразности, ролями и контролем по этапам
PMBOK	Свод знаний, принципов и практик; не программа-трекер
Agile	Ценности и принципы адаптивной работы и обратной связи
Scrum	Фреймворк с ответственностями, событиями и артефактами; работа спринтами
Kanban	Управление потоком: визуализация, ограничение WIP, улучшение процесса
Жизненный цикл	Предиктивный, адаптивный или гибридный подход выбирают по неопределённости
Риск	Неопределённое событие; оцениваются вероятность, влияние и ответ
Заинтересованная сторона	Тот, кто влияет на проект или затронут его результатом

Планирование и контроль

WBS описывает состав работ. Календарный план добавляет длительности, зависимости и ресурсы. Веха — значимое событие нулевой длительности. Критический путь — длиннейшая цепь зависимостей; в обычной CPM-модели её полный резерв равен нулю. Экспертная оценка, аналогия и трёхточечный метод помогают оценить трудоёмкость; PERT = (O + 4M + P) / 6.

Мониторинг собирает данные; контроль сопоставляет их с базовым планом и инициирует решения. Метрики должны иметь источник и правило расчёта. Количество строк кода и размер базы не являются сами по себе показателями соблюдения сроков или принятого объёма.

9.2 Разбор примеров теста и завершение

Задание из методички	Ответ	Обоснование
А1: критический путь	2	Задержка работ этой цепи сдвигает завершение
А2: веха	2	Контрольная точка с нулевой длительностью
Б1: показатели контроля	1, 3, 4	Сроки, объём и открытые дефекты

Задание из методички	Ответ	Обоснование
В1: документы	1–б; 2–г; 3–а; 4–в	ТЗ — требования; реестр — учёт; ПМИ — проверки; руководство — эксплуатация

Г1. Отставание критической работы на две недели

Первое действие — перераспределить свободных исполнителей на критическую работу, предварительно проверив делимость задачи и цену координации. Второе — согласовать сокращение или перенос необязательной функциональности, не затрагивая критерии обязательной приёмки. Третье, если допустимо, — частично распараллелить зависимые работы с управлением риском переделок. Если эти меры не восстанавливают срок, необходимо официально изменить базовый план. Простая смена даты в карточке не устраняет отставание.

Программная документация и приёмка

ТЗ фиксирует назначение, требования, этапы и порядок приёмки по ГОСТ 19.201-78 [8]. ПМИ по ГОСТ 19.301-79 [9] задаёт объект и цель испытаний, проверяемые требования, требования к документации, средства и порядок, методы испытаний. Протокол отдельно фиксирует полученные результаты. Руководство оператора по ГОСТ 19.505-79 [13] описывает подготовку, выполнение и сообщения пользователю.

Самопроверка	Состояние подготовки
Определения, ограничения, роли	Ответы приведены; самостоятельная проверка нужна
Методологии и жизненный цикл	Ключевые различия сформулированы
WBS, оценки, критический путь	Определения и формула PERT приведены
Контроль, риски, коммуникации	Принципы повторены
Завершение и документы	Состав ПМИ и назначение документов раскрыты

Чек-лист приёмки и вывод

Подготовлены ответы на опубликованные примеры. Не указаны вымышленные баллы, оценка или факт сдачи.

Вывод. Теоретическая памятка готова; итоговая оценка определяется преподавателем после самостоятельного теста.

10 Практическая работа № 10. Управление бюджетом

МДК 02.02 «Управление проектами» • ИТС-31 • Коновалов • 19.10.2026

10.1 Учебная смета в трудозатратах

Цель — запланировать и проконтролировать трудовые ресурсы. Денежные затраты не рассчитываются, как требует ПР10 [3]. Связь с ЕСПД: в ТЗ предусмотрены технико-экономические показатели (ГОСТ 19.201-78 [8]), в пояснительной записке — ожидаемые показатели (ГОСТ 19.404-79 [10]).

Смета согласована с ПР3: базовый план 320 чел.-ч; разработка 176 ч соответствует 60 задачам ПР2. Фактические журналы не предоставлены, поэтому столбец «факт» отмечен «н/д». Для демонстрации расчёта отдельно введён учебный сценарий завершения.

Статья	План	Факт	Сценарий	Δ, ч	Расход / план
Аналитика	24	н/д	26	+2	108,3 %
Проектирование	24	н/д	24	+0	100,0 %
Разработка	176	н/д	184	+8	104,5 %
Тестирование	48	н/д	54	+6	112,5 %
Документация	32	н/д	30	-2	93,8 %
Защита	16	н/д	18	+2	112,5 %
Итого	320	н/д	336	+16	105,0 %

Формулы: трудозатраты = число исполнителей × время; отклонение = факт − план; расход бюджета = факт / план × 100 %; остаток = план − факт. В учебном сценарии вместо факта подставлены модельные значения. Процент расхода не равен проценту готовности: 105 % бюджета не означает 105 % выполненных работ.

Ресурсный бюджет

Роль / группа	План, ч	Пояснение
Команда «Ядро»	96	Цикл, голосование и проверки
Команда «Интерфейс»	96	Лобби, роли, управление
Команда «Данные»	80	История, экспорт и связь
Р1	24	Планирование и координация
Р2	24	Документы и сборка
Итого	320	11 мест по ТЗ; состав условный

10.2 Отклонения, причины и меры

В сценарии общий перерасход равен 16 ч, или 5,0 % от 320 ч. Разработка даёт +8 ч, тестирование +6 ч, аналитика и защита — по +2 ч; документация компенсирует 2 ч. Отрицательный остаток сценарного бюджета равен −16 ч. Это пример управленческого анализа, не восстановление реальных трудозатрат по Git-коммитам.

Статья / гипотеза причины	Управляемость	Предлагаемая мера
Разработка: серверные зависимости недооценены	Частично	Выделить сервер в отдельный пакет и согласовать MVP
Тестирование: повторные исправления D-01/D-02	Да	Добавить smoke-проверку загрузки и регресс голосования
Аналитика: уточнение границ локального режима	Да	Согласовать матрицу «требование — реализация» до кодирования
Защита: незапланированные повторы показа	Да	Проверить сценарий и резервный показ заранее
Документация: повторное использование структуры	Да	Сохранять шаблон и единый реестр

План удержания бюджета

1. P1 фиксирует обязательный объём MVP. 2. Команда «Данные» передаёт часть свободного ресурса на регресс. 3. Необязательные анимации и дополнительные темы откладываются. 4. Перед каждым PR запускается проверка загрузки HTML без ошибок. 5. P2 собирает личные журналы еженедельно. Поскольку доступность модели составляет 352 ч, сценарные 336 ч помещаются в общий фонд с остатком 16 ч; календарный срок при этом отдельно проверяется по критическому пути.

Как получить достоверный факт

Для каждой записи нужны дата, участник, задача, фактически затраченное время и результат. Часы суммируются по статьям, исключая дубли. Количество коммитов не переводится в часы. Без этих записей нельзя установить, какая часть сценарного перерасхода существовала в действительности.

Ответы на контрольные вопросы

1) Учебный бюджет измеряется в человеко-часах. 2) Человеко-часы — сумма времени участников. 3) Статьи: аналитика, проектирование, разработка, тесты, документы и защита. 4) Δ = факт − план; расход = факт / план. 5) Причины: недооценка, доработки и переделки. 6) Помогают приоритизация, перераспределение и раннее обнаружение ошибок.

Чек-лист приёмки и вывод

Смета и сценарий рассчитаны; суммы согласованы с ПР2 и ПР3. Фактические часы отсутствуют.

Вывод. Базовый бюджет — 320 ч; сценарий 336 ч показывает механизм контроля, но не доказывает реальный перерасход.

11 Практическая работа № 11. Заинтересованные стороны

МДК 02.02 «Управление проектами» • ИТС-31 • Коновалов • 19.10.2026

11.1 Реестр сторон и матрица «власть — интерес»

Цель — выявить стороны проекта и спланировать взаимодействие. В ТЗ [2] зафиксированы преподаватель-заказчик, команда, ведущий и игроки. ГОСТ 19.201-78 [8] задаёт основу требований и приёмки; матрица сторон — управленческий учебный инструмент, а не обязательная форма ЕСПД.

Сторона	Интерес	Власть / интерес	Стратегия
Мифтахов Н.И., преподаватель	Выполнение ТЗ, вклад и защита	Высокая / высокий	Активно вовлекать
Команда из 11 мест	Понятные задачи и зачёт	Высокая / высокий	Совместно согласовывать
Ведущий партии	Управление без сбоев	Средняя / высокий	Регулярно информировать
Игроки	Скрытность ролей и удобство	Низкая / высокий	Собирать отзывы
Администратор аудитории / сети	Безопасность и доступность	Высокая / низкий	Поддерживать удовлетворённость
Рецензент / другая команда	Проверяемость инструкций	Низкая / средний	Информировать по запросу

Администратор сети и внешний рецензент включены как предполагаемые участники процесса; персоналии и фактическое участие не подтверждены. Для матрицы средний интерес отнесён к низкому, средняя власть ведущего — к низкой относительно права менять ТЗ.

	Низкий интерес	Высокий интерес
Высокая власть	Администратор сети: согласовать условия	Преподаватель, команда: активно вовлекать
Низкая власть	Рецензент: наблюдать и отвечать	Ведущий, игроки: информировать и получать отзывы

Обоснование ключевых стратегий

Преподаватель утверждает требования и принимает работу, поэтому получает регулярный отчёт и решения по отклонениям. Команда непосредственно влияет на реализацию, ей нужны ежедневные рабочие связи. Администратор может заблокировать сетевую демонстрацию, поэтому условия и доступы согласуются заранее, хотя игровые функции ему малоинтересны.

11.2 План коммуникаций и проверка расхождений

Кому	Что / канал	Частота	Владелец
Преподаватель	Вехи, риски / краткий отчёт и показ	Еженедельно	Р1
Команда	План, блокеры / стендап и карточки	Каждое занятие	Р1

Кому	Что / канал	Частота	Владелец
Ведущий	Управление / пробный сценарий	Перед демо	Интерфейс
Игроки	Понятность / тест и форма отзыва	Каждая проверка	Тестировщик
Администратор	Сеть, браузеры / согласование	За неделю до показа	P1
Рецензент	Инструкция / ссылка и чек-лист	Перед защитой	P2

Сопоставление плана с доступными доказательствами

План	Наблюдаемое состояние	Расхождение / риск
Еженедельный отчёт	Текст ТЗ есть, отчётов сверок нет	Ритм согласований не подтверждён
Задачи и личный вклад	Выгрузка трекера отсутствует	Нельзя проверить распределение
Отзывы игроков	Заполненные формы не предоставлены	UX не подтверждён аудиториями
Сетевая демонстрация	Есть клиент WebSocket, сервера в срезе нет	Нельзя подтвердить общий сеанс
Внешняя проверка инструкции	Протокол стороннего участника отсутствует	Онбординг остаётся непроверенным

Отсутствие протокола не доказывает, что общение не происходило. В отчёте отмечено отсутствие проверяемого свидетельства. Для закрытия расхождений следует завести единый журнал решений: дата, вопрос, решение, согласовавший, задача, срок.

Шаблон сообщения по отклонению

«Ревизия 293145e. На загрузке выявлен D-01: обращение к отсутствующему элементу настроек. Влияние — часть обработчиков не регистрируется. Предлагается согласовать DOM и JS и повторить smoke-тест. Ответственный — команда интерфейса; срок — ближайшее занятие; принятие — после отсутствия ошибок в консоли».

Ответы на контрольные вопросы

1) Стороны влияют на результат или затронуты им. 2) Высокая власть позволяет остановить проект даже при низком интересе. 3) Матрица строится по двум независимым осям. 4) Вовлечение включает решения, информирование — передачу статуса. 5) План задаёт адресата, содержание, канал, частоту и владельца. 6) Нерегулярность ведёт к поздним изменениям и конфликтам ожиданий.

Чек-лист приёмки и вывод

Выявлено 6 сторон, составлены матрица и план; фактические коммуникации требуют протоколов.

Вывод. План позволяет вовремя согласовывать ограничения и не подменять отсутствующие сведения предположениями.

12 Практическая работа № 12. Управление знаниями

МДК 02.02 «Управление проектами» • ИТС-31 • Коновалов • 19.10.2026

12.1 База знаний, архитектура и запуск

Цель — сделать знания о проекте доступными и воспроизводимыми. Для описания эксплуатации использованы принципы ГОСТ 19.505-79 [13], общая структура документов — ГОСТ 19.105-78 [5]. База знаний не публиковалась в исходный репозиторий; её заготовка включена в архив отчёта.

Раздел	Содержание / владелец
Регламенты	Ветки, ID коммита, статусы и ревью / P1
Инструкции	Скачать, открыть, проверить, упаковать / P2
Архитектура	7 модулей и режимы local/network / команды
Типовые решения	Хранение, роли, экранирование, CSV / разработчики
Ошибки	Причина, воспроизведение, исправление, регресс / тестировщик
Онбординг	Доступы, чтение ТЗ, первый запуск / P2

Архитектура текущего клиента

Браузер → HTML/CSS-интерфейс → JavaScript-модули → localStorage. Лобби передаёт состав игроков модулю ролей; роли и действия используются игровым циклом; голосование меняет состояние участников; панель ведущего управляет фазами; журнал и коммуникации отображают события. В network-режиме клиент отправляет JSON по WebSocket внешнему серверу. Серверная реализация в проверенном срезе отсутствует [1].

Инструкция локального запуска

1. Скачать репозиторий или выполнить git clone https://github.com/Bossburgeoff/Mafia.git. 2. Открыть Mafia-2026-Adaptive.html в современном браузере. 3. Оставить локальный режим. 4. Создать комнату и проверить код. 5. Открыть консоль разработчика и зафиксировать ошибки. Сборщик и установка npm-зависимостей для этого HTML не нужны.

Проверено 19.10.2026: HTML открывается, комната создаётся, но инициализация выдаёт ошибку D-01. Поэтому инструкция описывает запуск с известным ограничением, а не гарантированный полный игровой сеанс. Сетевой URL не следует выдумывать; его предоставляет владелец сервера.

12.2 Решения, ошибки и проверка знаний

Решение, найденное в коде	Польза / ограничение
localStorage + JSON	Автономные данные; это не общая серверная БД
shuffle / roleDeck	Случайная колода; локальные роли не защищены от владельца браузера
esc для текста чата	Экранирование специальных символов
CSV с BOM и ;	Читаемость кириллицы; кавычки удваиваются

Решение, найденное в коде	Польза / ограничение
WebSocket hello и clientId	Контур сетевого клиента; требуется внешний сервер

Ошибка / риск	Причина	Решение / состояние
D-01: остановка инициализации	Нет #soundSetting и #motionSetting	Согласовать DOM/JS; не исправлялось
D-02: повторное воздержание	null проверяется как ложное значение	Object.hasOwn(r.votes, name); не исправлялось
Нет общего сетевого состояния	В поставке нет сервера	Реализовать и испытать сервер
Риск смены имени	Голоса индексируются именем	Предлагается стабильный ID игрока

Перечисленные решения найдены в коде; проверенными «исправленными ошибками команды» они не объявляются. Первые два дефекта воспроизведены локально, остальные пункты — ограничения и проектные риски.

Онбординг и протокол проверки

В первый день участник получает доступ к репозиторию и трекеру, читает ТЗ, изучает роли команд, запускает HTML, знакомится с D-01/D-02 и берёт одну небольшую задачу. Затем создаёт feature-ветку, коммит с ID, PR и просит ревью.

Инструкция	Проверка / результат
Скачать и открыть HTML	Выполнено локально; страница открывается
Создать комнату	Выполнено; создан пятисимвольный код
Добавить ботов	Не проходит до исправления D-01
Скачать CSV	Обработчик проверен; файл получен
Собрать ZIP с HTML и инструкцией	Описано; не равно серверному дистрибутиву
Проверка участником другой команды	Не проводилась; нужен реальный участник и протокол

Ответы на контрольные вопросы

1) Явное знание записано; неявное существует в опыте. 2) Нужны регламенты, инструкции, архитектура, ошибки и онбординг. 3) Практическая проверка выявляет пропуски шагов. 4) Разбор ошибок предотвращает их повторение. 5) Другой участник выполняет инструкцию без подсказок. 6) Зависимость от одного человека создаёт риск потери знаний.

Чек-лист приёмки и вывод

Составлены база знаний и инструкция; сторонняя проверка не проводилась.
Вывод. Материалы позволяют начать работу и увидеть реальные ограничения, но требуют внешней проверки после исправлений.

13 Практическая работа № 13. Подготовка к защите

МДК 02.02 «Управление проектами» • ИТС-31 • Коновалов • 19.10.2026

13.1 Итоговые материалы и защитный доклад

Цель — проверить готовность материалов и спланировать защиту. Основание: ПР13 [3], требования приёмки ТЗ [2] и ГОСТ 19.301-79 [9]. Настоящий отчёт не является актом приёмки программы.

Материал	Версия	Готовность
Исходный HTML-клиент	293145e	Есть; D-01/D-02 не устранены
Техническое задание	Срез 293145e	Есть; версия внутри не указана
Комплект ЛР1–ЛР9	Входной образец	Есть; проверка сдачи не проводилась
Отчёты ПР1–ПР13	1.0 от 19.10.2026	Подготовлены
Бэклог и регламент	1.0	Подготовлены как проектные материалы
Презентация команды	293145e, 10 слайдов	Для ПР13 нужно расширить до 12–15
Сервер и 10 партий	—	Нет подтверждения
Личные журналы и вклад	—	Не предоставлены

Структура защитной презентации: 13 слайдов

1 — название и участники; 2 — проблема и цель; 3 — требования ТЗ; 4 — архитектура и режимы; 5 — обязанности команд; 6 — интерфейс и лобби; 7 — роли, цикл и голосование; 8 — данные и сообщения; 9 — план и вехи; 10 — подтверждённые метрики; 11 — проверки и дефекты; 12 — ограничения и развитие; 13 — личный вклад и вывод. Это план доработки, не новый созданный PPTX.

Сценарий показа на 4–5 минут

0:00–0:40 — назначение и версия. 0:40–1:30 — главный экран. 1:30–2:20 — создание комнаты. 2:20–3:10 — объяснение модулей и локального режима. 3:10–4:00 — протокол ошибок и приоритет исправлений. 4:00–4:40 — документы, вклад и вывод. До устранения D-01 полный сеанс не обещается; резерв — снимки и разбор кода.

13.2 Ответы, репетиция и решение о готовности

Вопрос защиты	Тезис ответа
Какую задачу решает проект?	Автоматизация функций ведущего игры
Какие технологии используются?	HTML, CSS, JS, localStorage; WebSocket-клиент
Есть ли многопользовательский сервер?	В проверенном срезе не найден; сетевой сеанс не подтверждён
Как защищаются роли?	Локальный режим не обеспечивает секретность от владельца браузера; нужен сервер

Вопрос защиты	Тезис ответа
Какие проверки выполнены?	Загрузка, комната, порог старта, тестовые 6 игроков, обработчики паузы и CSV
Какие дефекты обнаружены?	D-01: DOM-настройки; D-02: повторное воздержание
Как подтверждается личный вклад?	Карточками, коммитами, журналом; эти данные ещё нужны
Можно ли принять проект?	Нет оснований без исправлений и испытаний по ТЗ

Лист репетиции

Параметр	План / фактическое состояние
Участники	Докладчик и внешний слушатель / не назначены
Целевое время	4 мин 40 с / фактическое время не замерялось
Вопросы слушателя	5–7 / не получены
Замечания	Заполняются по итогам реальной репетиции
Повторный прогон	После исправления D-01 и обновления слайдов

План исправлений: команда интерфейса — устранить D-01; команда ядра — устранить D-02 и провести регресс; P2 — оформить руководство и реестр; P1 — собрать журналы и согласовать сетевой объём; команда — расширить презентацию и провести репетицию с фиксацией времени. Исправления в репозиторий в рамках этой работы не вносились.

Ответы на контрольные вопросы

1) Оцениваются продукт, документы, процесс и вклад. 2) Исполнитель лучше объясняет решения и ограничения. 3) Внешний слушатель выявляет непонятные места. 4) Нужно признать пробел и предложить проверку, не выдумывать ответ. 5) При сбое перейти к резервным материалам. 6) Метрики проверяемы и позволяют сравнить результат с критериями.

Чек-лист приёмки и вывод

Подготовлены перечень материалов, план 13 слайдов и ответы. Репетиция, устранение дефектов и итоговая приёмка не подтверждены.

Вывод. Комплект отчётов подготовлен; полная готовность программного продукта к защите требует перечисленных проверок и доказательств.
